


1.- Ámbito de la actuación. Zona As Avenidas (Convenio de abrir Vigo al Mar)



2.- Ámbito de la actuación. Zona As Avenidas (Convenio de abrir Vigo al Mar)

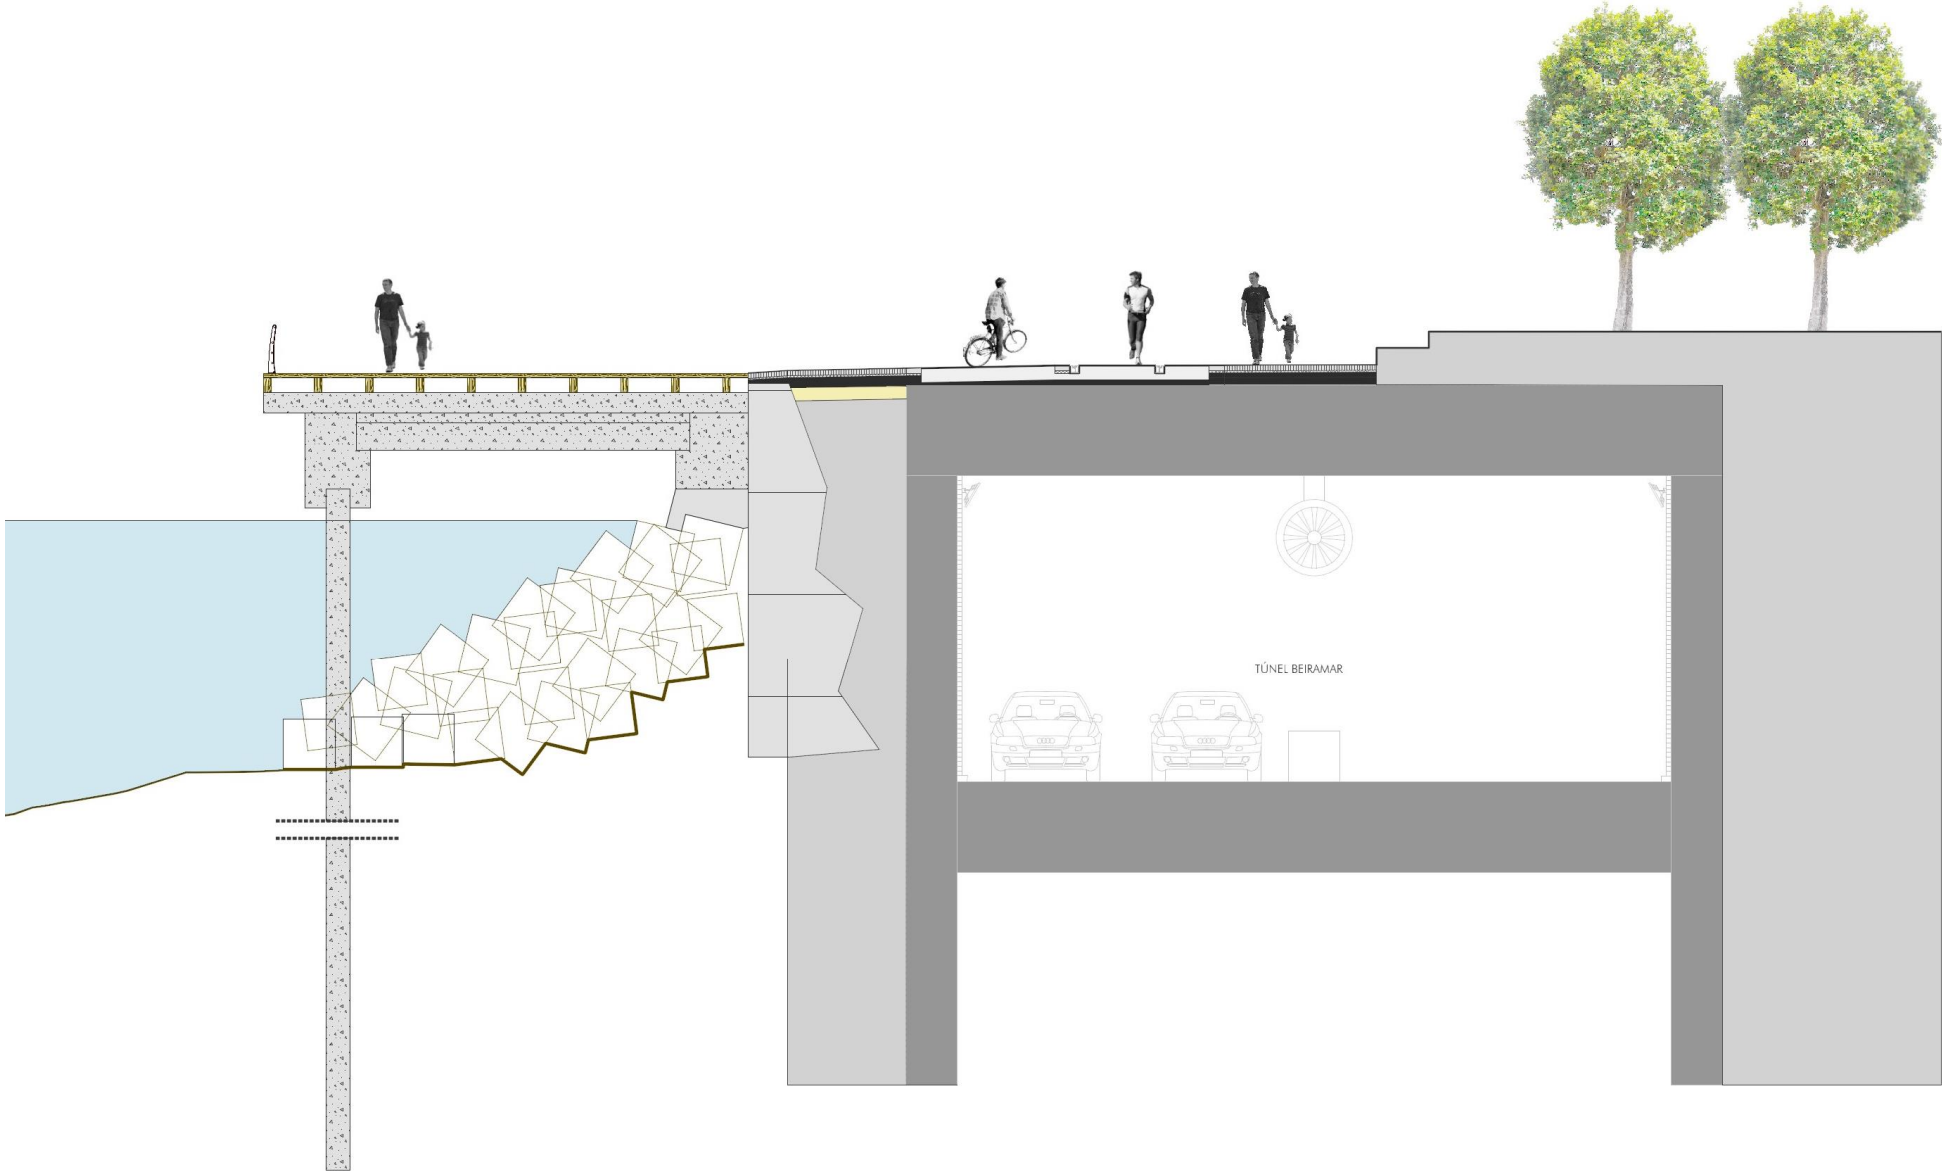

3.- Cronograma

Convenio Abrir Vigo al Mar: Expiró el 02.10.2019

Licitación de Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto: Septiembre del 2019

Adjudicación de Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto: 21.10.2019

Acondicionamiento de tramo enlosado en As Avenidas en el ámbito del Convenio Abrir Vigo al Mar:

Proyecto Constructivo elaborado: 04.03.2020

Obra adjudicada: junio de 2020

Inicio Obra: julio de 2020

Fin de Obra: 9 meses después del inicio: abril de 2021

Reconstrucción del paseo marítimo en el entorno de la dársena náutica en As Avenidas en el ámbito del Convenio Abrir Vigo al Mar:

Proyecto Constructivo elaborado: Semana del 16 de marzo de 2020

Obra adjudicada: junio de 2020

Inicio Obra: julio de 2020

Fin de Obra: 6 meses después del inicio: enero de 2021

Vigo SeaFest: 1ª quincena de julio

O Marisquiño: 1ª quincena de agosto
